

STADION WALPERLOH

Stand der Hochbaumaßnahme
September 2025

“

HOHE ANFORDERUNGEN AN DIE PROJEKTSTEUERUNG

”

- 11 Planer und Gutachter
- 15 Firmen für die Hauptgewerke und
- 13 Firmen mit Kleinstaufträgen
- 13 Gewerke sind noch zu beauftragen

Los 0010- Rohbauarbeiten

Fa. Wolff und Müller GmbH, Erfurt

Bauzeit: 02/22 – 11/22

Stand: abgeschlossen



AUFTRAG: 2.146.702,23 €

SCHLUSSRECHNUNG: 2.180.632,14 €

Los 0020 - Dachabdichtungsarbeiten

Fischer Flachdach GmbH, Maltitz

Bauzeit: 03/22 – 10/24

Stand: abgeschlossen



AUFTRAG: 344.721,76 €

SCHLUSSRECHNUNG: 284.824,06 € + 10.979,54 € NACHFORDERUNGEN

Los 0030 – Außenfenster u. -türen PR Fassade

Schreinerei u. Metallbau Wagner,
Niederwürschnitz

Bauzeit: 05/23 – 11/23

Stand: abgeschlossen



AUFTRAG: 390.532,29 €
SCHLUSSRECHNUNG: 385.722,31 €



Los 0060 – Schlosserarbeiten
FSP GmbH, Wasungen

Bauzeit: 11/24 –
Stand: abgeschlossen, noch keine Abnahme



AUFTRAG: 27.703,32 €
SCHLUSSRECHNUNG:

Los 0070 – Trockenbau, Innentüren
Damian Werner GmbH, Kalbach

Bauzeit: 01/24 -
Stand: in Arbeit



AUFTRAG:
SCHLUSSRECHNUNG:

457.879,05 €

Los 0080 – Estricharbeiten
FBS GmbH, Merzig



AUFTRAG: 70.744,61 €
SCHLUSSRECHNUNG: 54.215,52 €

Bauzeit: 01/24 – 08/24
Stand: abgeschlossen



Los 0090 – Malerarbeiten
Damian Werner GmbH, Kalbach

Bauzeit: 08/24
Stand: in Arbeit



AUFTRAG: 74.796,28 €
SCHLUSSRECHNUNG:



Los 0100 – Bodenbelagsarbeiten
KUBO GmbH, Gotha

Bauzeit: 05/25
Stand: in Arbeit



AUFTRAG: 74.428,85 €
SCHLUSSRECHNUNG:



Los 0110 – Fliesenlegerarbeiten
Oberneyer, Schwallungen

Bauzeit: 12/24 -
Stand: in Arbeit



AUFTRAG: 178.630,63 €
SCHLUSSRECHNUNG:



Los 0210 – Heizung-, Lüftung-, Sanitär
HLSK Gerlach, Steinbach-Hallenberg

Bauzeit: 12/23 -
Stand: in Arbeit



AUFTRAG: 779.638,33 €
SCHLUSSRECHNUNG:



Los 0210 – Heizung-, Lüftung-, Sanitär
HLSK Gerlach, Steinbach-Hallenberg




Los 0220 – Elektroinstallation
Elektro Esser, Utendorf

Bauzeit: 01/24 -
Stand: in Arbeit



AUFTRAG:
SCHLUSSRECHNUNG:

486.549,24 €

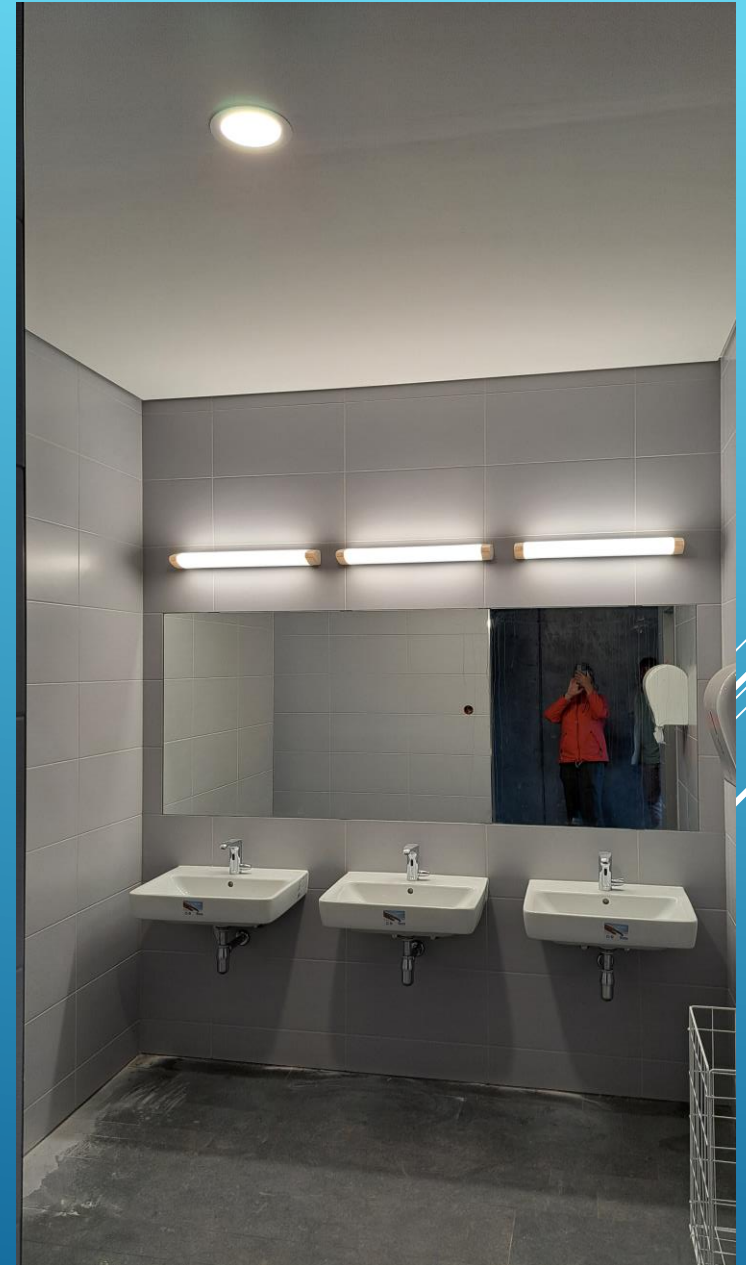

Bau einer Trafostation

Anliefertermin: 48 KW/25

Netzanschlussvertrag: 38.555,49 €



Derzeit im Vergabeverfahren:

Los	Leistung	Veröffentlichung	Ende Angebotsfrist	Ausführungsbeginn	Ausführungs-ende
5	Sportanlage und Außenanlagen	01.08.25	29.08.25	06.10.25	15.12.26
0120	Baureinigungsarbeiten	04.09.25	13.10.25	01.12.25	12.12.25
0021	Attika Dachabdichtung Klempnerarbeiten	08.09.25	21.10.25	27.04.26	17.07.26
0130	Beschilderung	08.09.25	21.10.25	05.01.26	17.07.26
0031	Fensterbänke außen	08.09.25	21.10.25	05.01.26	19.06.26
0032	Abdichtung Fenster und Außentüren	08.09.25	21.10.25	16.03.26	13.04.26
0040	Betonfertigteile als Außenwandverkleidung	04.09.25	13.10.25	05.01.26	19.06.26
0050	Vorhangfassaden und Abhangdecken aus Holz	04.09.25	13.10.25	05.01.26	28.08.26
0061	Stahl- und Metallbauarbeiten außen	04.09.25	13.10.25	05.01.26	01.05.26
0062	Drehkreuzanlage	08.09.25	21.10.25	05.01.26	17.04.26
0063	Fundamentarbeiten Drehkreuz	08.09.25	21.10.25	05.01.26	30.01.26

Noch auszuschreibende Leistungen:

[illegible]

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.

Wir sind auf einem guten Weg das
Hochbauprojekt Ende 2026 erfolgreich
abzuschließen.

Several thin, parallel white lines are drawn diagonally across the bottom right corner of the slide, extending from the right edge towards the center.
